



# Sloopwerkzaamheden

- Start maandag 14-09-26
- Werkzaamheden 07.00 – 17.00 uur
- Gereed 23-10-26
- Alle datums onder voorbehoud




# Damwanden aanbrengen

- Start 23-11-26 (**ALLE DATA ONDER VOORBEHOUD**)
- Werktijden 07.00 - 17.00 uur
- Gereed 11-12-26
- Damwanden van 11,5 m. worden gedrukt, niet getrild.



# waterglas injecteren

- Start 14-12-26
- Kerstvakantie week 52 en 53
- Gereed 20-01-27

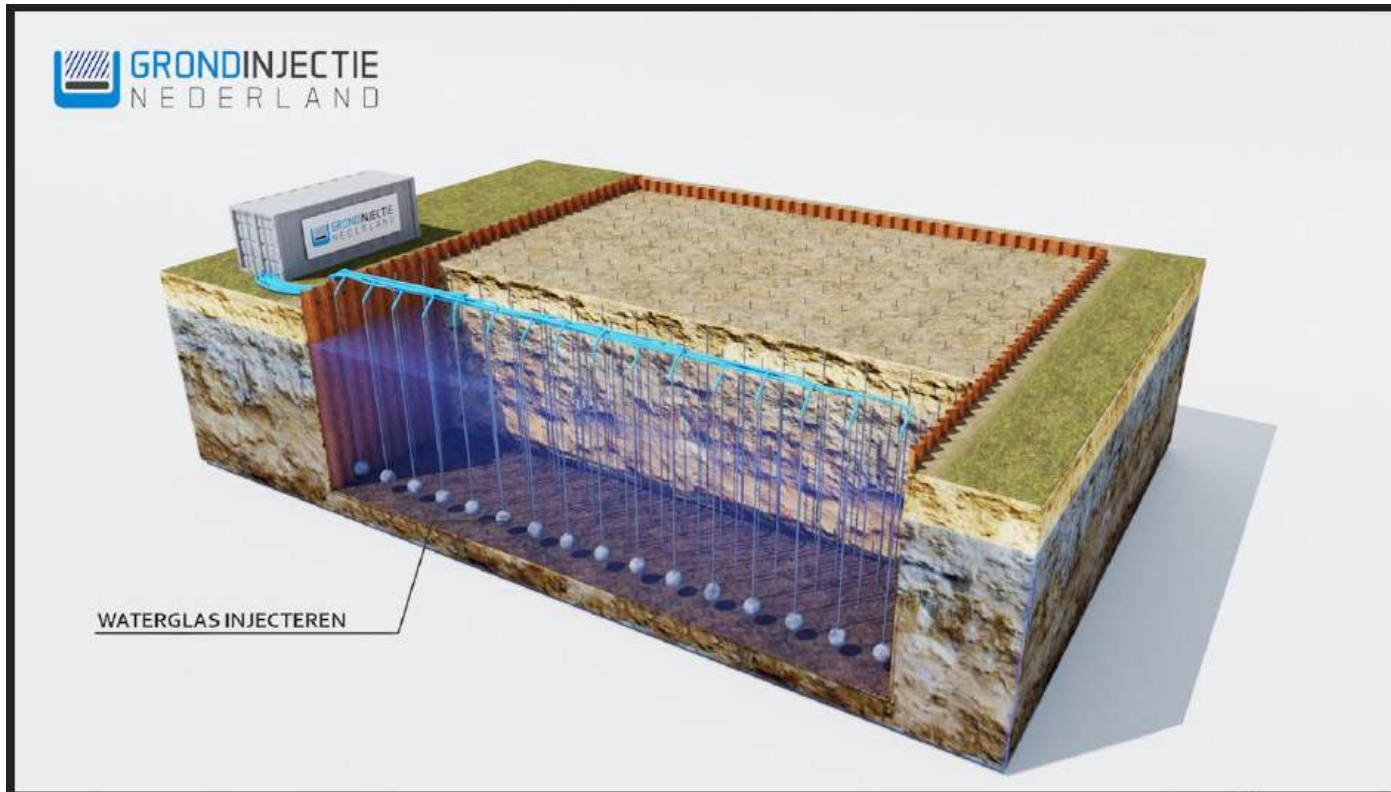

# bouwput bemalen

- Start 21-01-27 (**ALLE DATA ONDER VOORBEHOUD**)
- Totaal 1 week installeren;
- 2 a 3 dagen leeg pompen, max. 25m<sup>3</sup>/u;
- Daarna onderhoudsbemaling, ca. 5m<sup>3</sup>/u.



# bouwput ontgraven

- Start 28-01-26;
- Gereed 01-02-26;
- 07.00 – 17.00 uur
- Grondafvoer via de Zwarteweg, gemiddeld elk kwartier een zandauto



# Overlast tijdens de bouw

- Geluidsoverlast:
  - Geen werkzaamheden buiten genoemde tijden;
  - Geen werkzaamheden in het weekend;
  - Bemaling loopt 24/7 door, voorzien van noodstroom (diesel aggregaat);
- Stof (tijdens de sloop):
  - Bij droogweer en stof vorming, inzetten van sproei installatie;
- Verkeer:
  - Vrachtauto's laden en lossen op eigen terrein;
  - voldoen aan verkeerswet;
  - Eén week lang (tijdens ontgraven bouwput), ruim vier per uur via de Zwarteweg.

## In de tijd:

|                      |               |         |       |
|----------------------|---------------|---------|-------|
| Slopen               | 14/09         | 23/10   | 6 wk  |
| Plaatsen damwand     | 23/11         | 11/12   | 3 wk  |
| Aanbrengen waterglas | 14/12         | 20/01   | 4 wk  |
| Kerst vakantie       | week 52 en 53 |         |       |
| Leeg pompen bouwput  | 25/01         | 28/01   |       |
| Ontgraven bouwput    | 28/01         | 01/02   | 1 wk  |
| Betonnen kelder      | 04/02         | juni 27 | 20 wk |

# Bouwput en bemaling



M.V. 1,15 + NAP

Max. GWS 0,2 - NAP

indrukken damwand ca. 12 m. lang

Vanaf 23 november

M.V. 1,15 + NAP

Max. GWS 0,2 - NAP

inheidiepte damwand - 9,85 NAP



Damwand gereed 11 december

[illegible]

Vanaf 14 december aanbrengen waterglas om bouwput af te sluiten van omgeving

M.V. 1,15 + NAP

Max. GWS 0,2 - NAP

inheidiepte damwand - 9,85 NAP

waterglassinjectie

Eind januari 2027 waterglas gereed




M.V. 1,15 + NAP


Max. GWS 0,2 - NAP


inheidiepte damwand - 9,85 NAP

waterglassinjectie

Installeren bemaling eind januari 2027

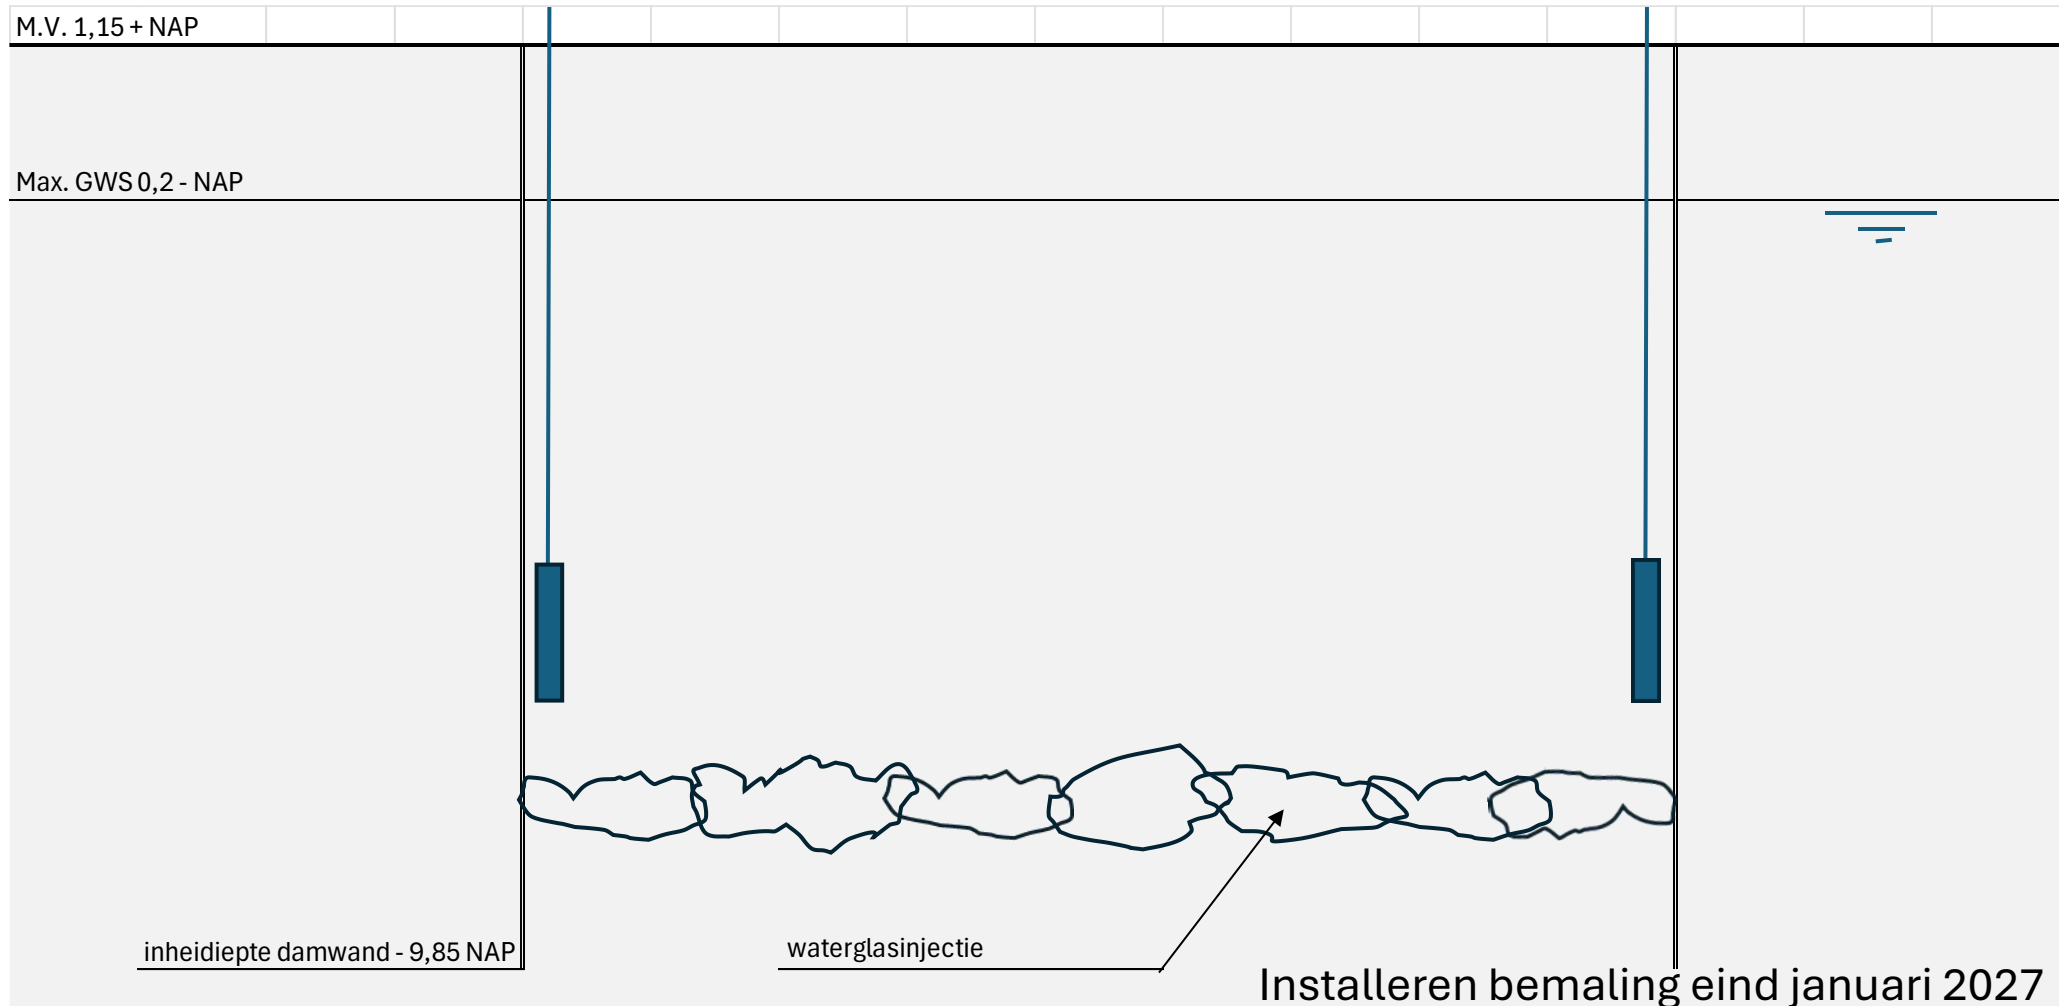

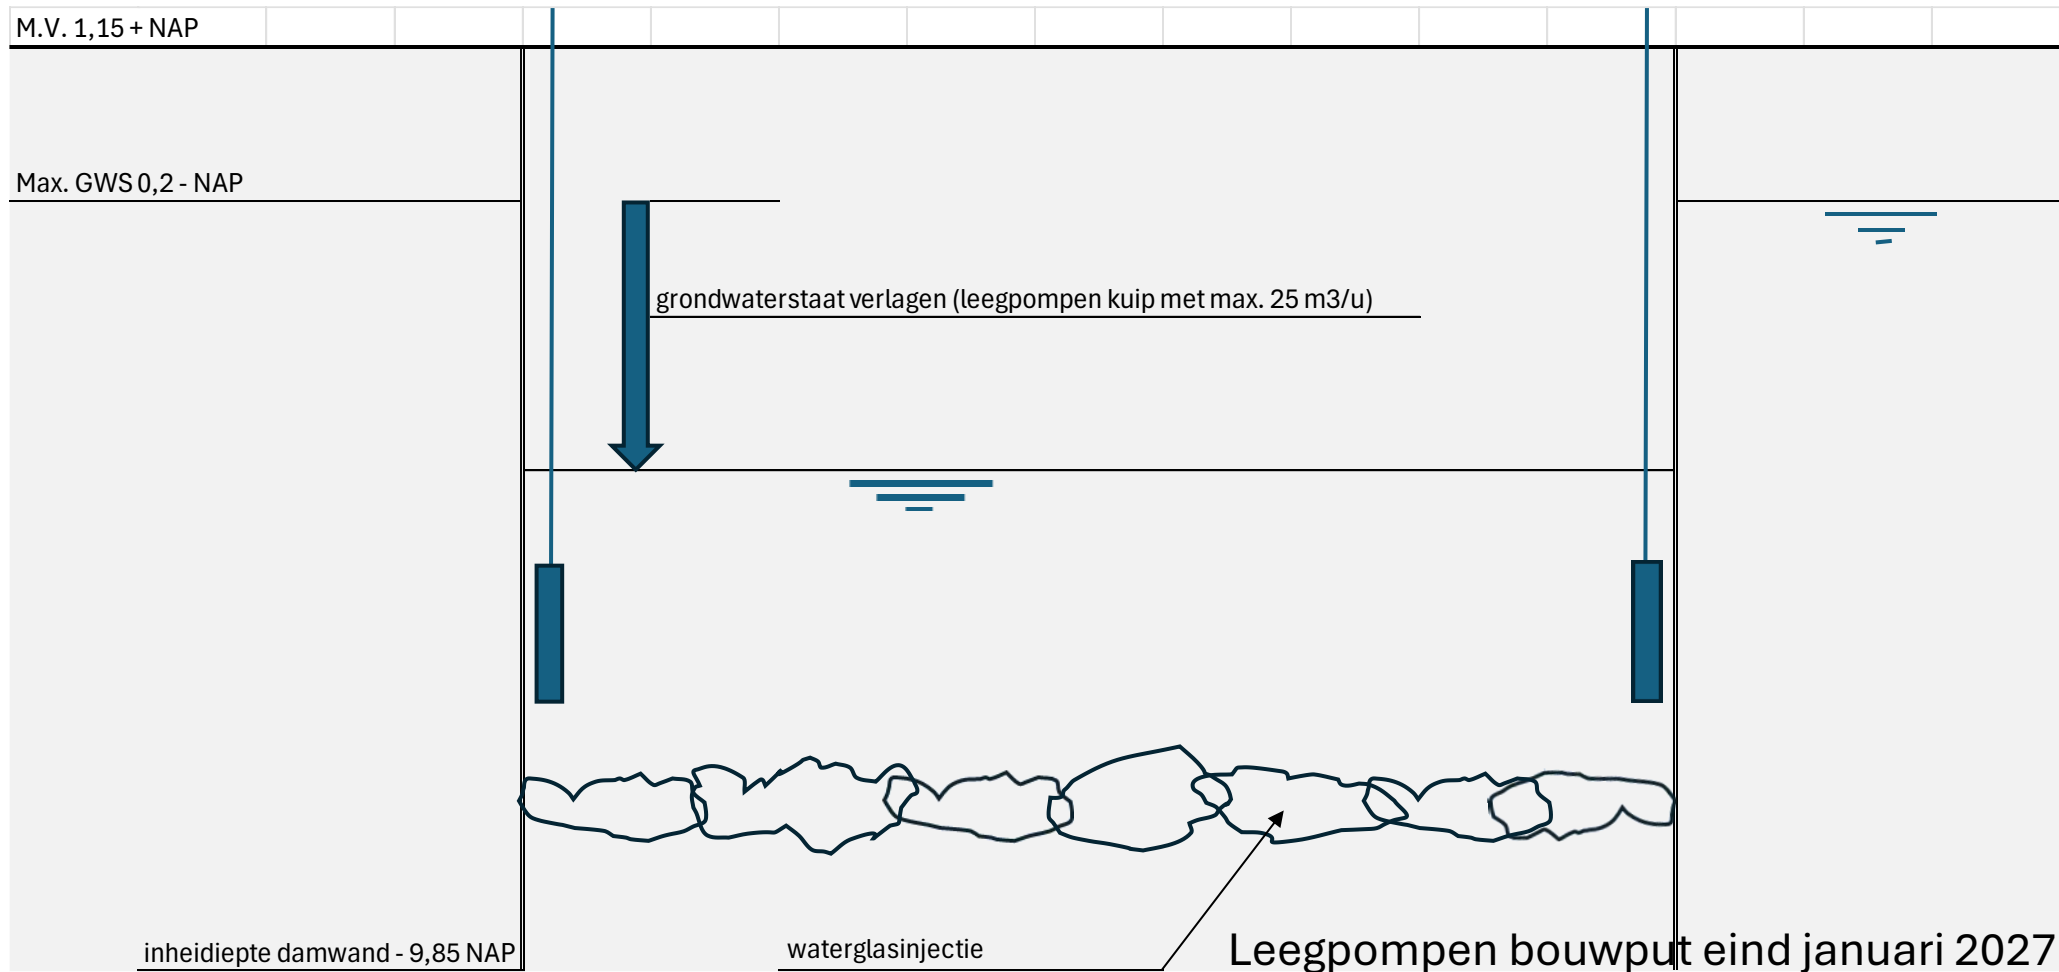

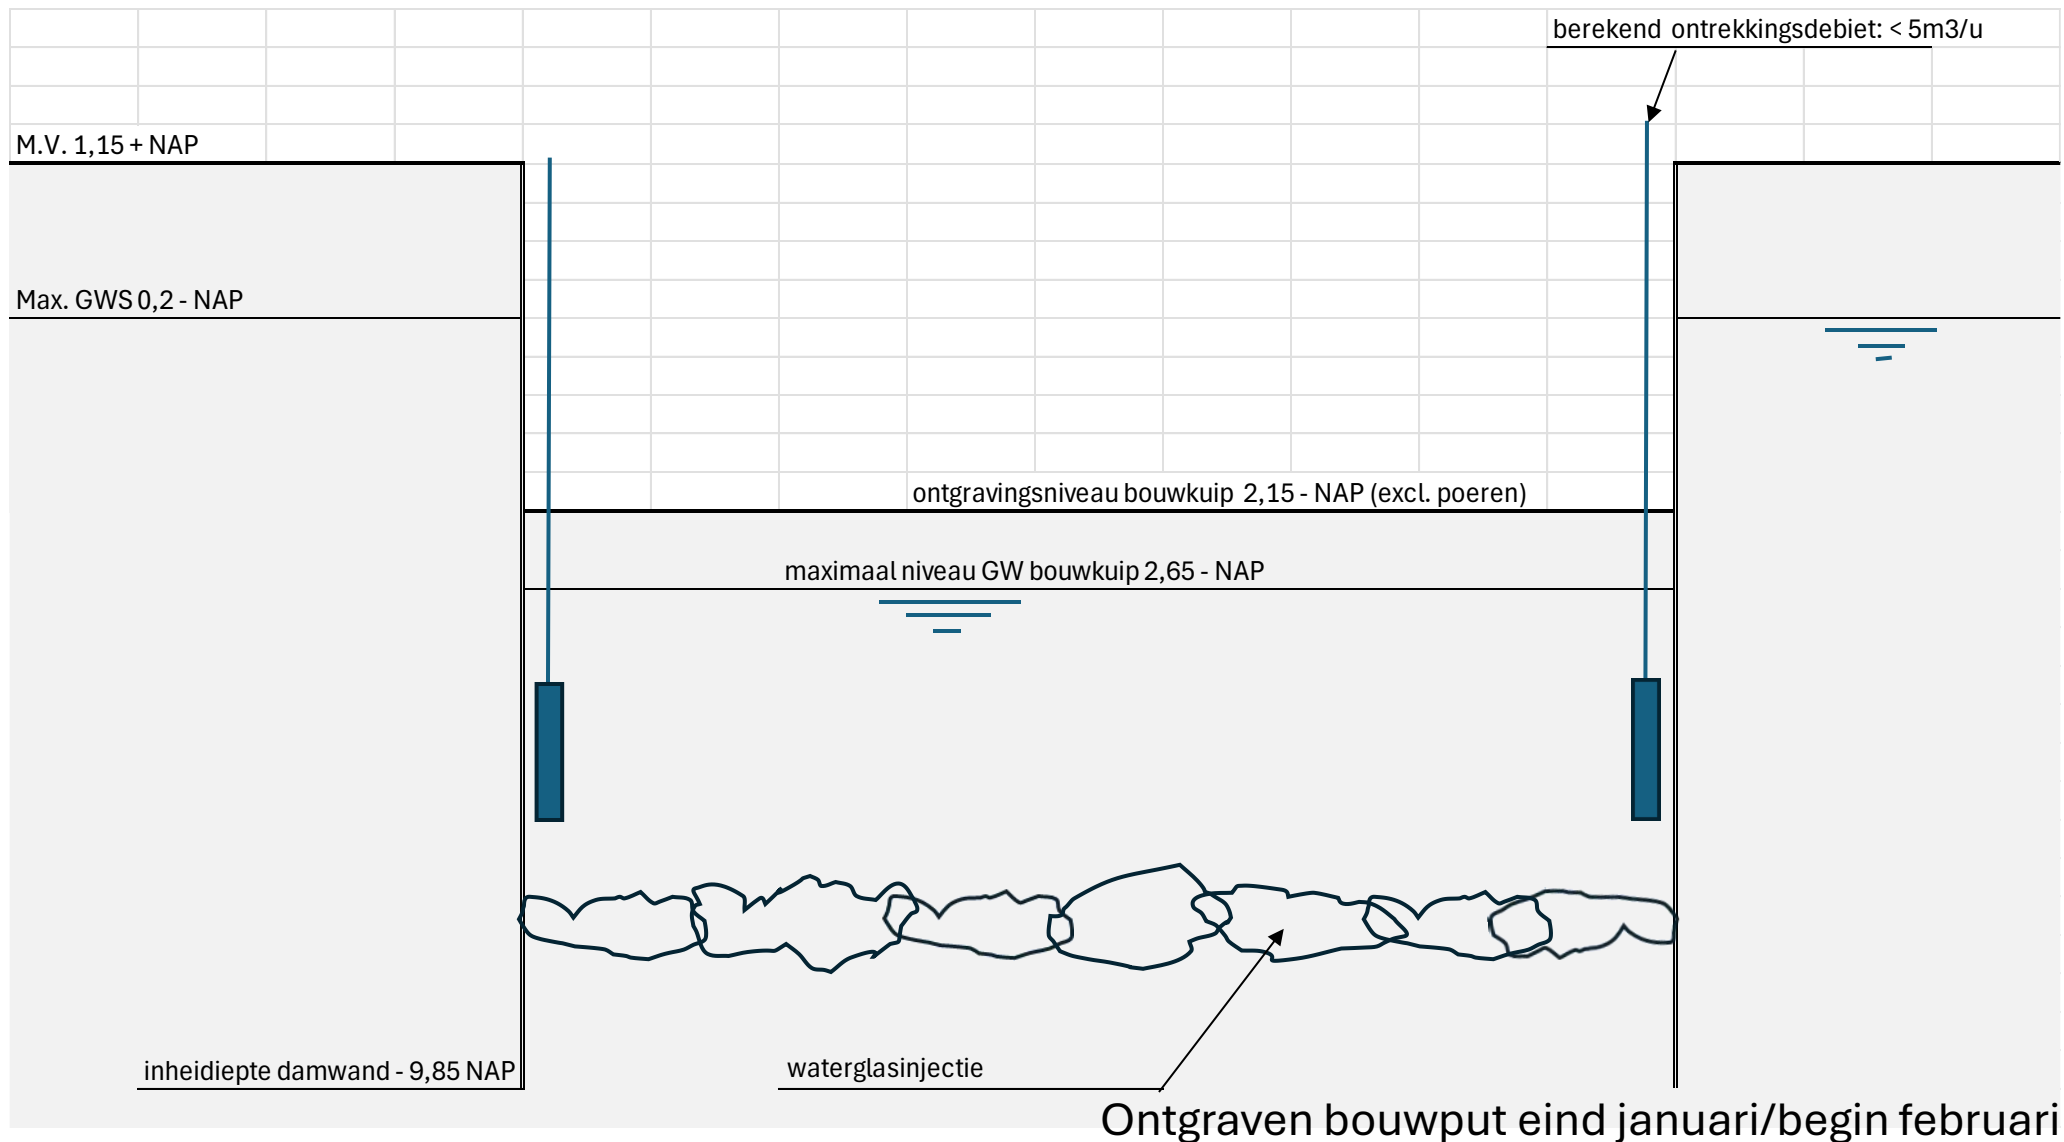

M.V. 1,15 + NAP

Max. GWS 0,2 - NAP

maximaal niveau GW bouwkuip 2,65 - NAP

inheidiepte damwand - 9,85 NAP

waterglasinjectie

Vanaf begin februari start bouw kelder

