# 16 app CPO Spiegelhoek Bussum

CPO Spiegelhoek

Uitvoering

bouwonderneming van bekkum | amersfoort

| Regel | Naam | Start | Duur |
|---|---|---|---|
| 1 | **Werkbare dagen** | **23-11-2026** | **425d** |
| 2 | Werkbare dagen contract | 23-11-2026 | 425d |
| 3 | **Bouwplaats, sloopwerk & grondwerk** | **14-9-2026** | **50d** |
| 4 | uitzetten erfgrenzen, inmeten en hoogtematen | 14-9-2026 | 2d |
| 5 | Bouwaansluitingen realiseren | 14-9-2026 | 4d |
| 6 | Bouwplaatsinrichting (hekken en keten) | 14-9-2026 | 10d |
| 7 | Sloopwerkzaamheden | 14-9-2026 | 30d |
| 8 | Grondonderzoek | 26-10-2026 | 5d |
| 9 | Archelogisch onderzoek | 26-10-2026 | 20d |
| 10 | Opschonen en uitvlakken bouwterrein | 16-11-2026 | 5d |
| 11 | **Fundering, kelder & begane grondvloer** | **23-11-2026** | **159d** |
| 12 | Damwanden aanbrengen | 23-11-2026 | 15d |
| 13 | Bodeminjectie | 14-12-2026 | 18d |
| 14 | Bemaling | 21-1-2027 | 5d |
| 15 | Uitgraven kelder | 28-1-2027 | 5d |
| 16 | Betonbouw kelder | 4-2-2027 | 60d |
| 17 | Onderstempeling begane grondvloer + betonbalken | 29-4-2027 | 5d |
| 18 | Bekisting betonbalken | 4-5-2027 | 5d |
| 19 | Breedplaatvloer begane grond | 13-5-2027 | 2d |
| 20 | Wapening, leidingwerk, bekisten vloer | 18-5-2027 | 15d |
| 21 | Afstorten vloer & ontkisten | 8-6-2027 | 2d |
| 22 | Damwanden trekken | 10-6-2027 | 5d |
| 23 | Aanvullen kelder | 11-6-2027 | 5d |
| 24 | Fundering buitenruimtes (bekisten, wapenen, storten) | 18-6-2027 | 10d |
| 25 | Aanbrengen riool en aanvullen fundering | 2-7-2027 | 5d |
| 26 | Bronboringen t.b.v. warmtepompinstallatie | 9-7-2027 | 10d |
| 27 | **Begane grond** | **25-6-2027** | **18d** |
| 28 | Betonwanden | 25-6-2027 | 5d |
| 29 | Plaatsen CLT wanden | 2-7-2027 | 10d |
| 30 | Onderstempeling 1e verdiepingsvloer en balkonplaten | 14-7-2027 | 5d |
| 31 | **1e verdieping** | **21-7-2027** | **39d** |
| 32 | Breedplaatvloer en balkonplaten 1e verdieping | 21-7-2027 | 4d |
| 33 | Wapening, leidingwerk, bekisten vloer | 24-8-2027 | 15d |
| 34 | Afstorten vloer & ontkisten | 14-9-2027 | 2d |
| 35 | Betonwanden | 16-9-2027 | 5d |
| 36 | Plaatsen CLT wanden | 23-9-2027 | 10d |
| 37 | Onderstempeling 2e verdiepingsvloer | 5-10-2027 | 5d |
| 38 | **2e verdieping** | **12-10-2027** | **28d** |
| 39 | Breedplaatvloer 2e verdieping | 12-10-2027 | 2d |
| 40 | Wapening, leidingwerk, bekisten vloer | 14-10-2027 | 15d |
| 41 | Afstorten vloer & ontkisten | 4-11-2027 | 2d |
| 42 | Betonwanden & prefab dakplaat | 8-11-2027 | 5d |
| 43 | Plaatsen CLT wanden | 15-11-2027 | 4d |
| 44 | **Gevel en dakwerkzaamheden** | **23-7-2027** | **213d** |
| 45 | Steigerwerk incl beveiliging per verdieping | 23-7-2027 | 71d |
| 46 | Stelwerk metselwerk, houten kozijnen en stelkozijnen | 16-9-2027 | 60d |
| 47 | Muurplaten, knieschotten, spanten & platdakconstructie | 15-11-2027 | 25d |
| 48 | Dakplaten | 20-12-2027 | 10d |
| 49 | Panlatten, dakapellen & dakramen | 10-1-2028 | 15d |
| 50 | Dakbedekking platte daken & dakapellen | 17-1-2028 | 20d |
| 51 | Installaties op dak & PV panelen | 31-1-2028 | 15d |
| 52 | Dakpannen | 7-2-2028 | 20d |
| 53 | Metselwerk, geveldragers & betonlateien met steenstrips (5.000pw) | 15-10-2027 | 75d |
| 54 | Timmerwerk plafonds, goten, dakkapellen en gevels | 10-1-2028 | 40d |
| 55 | Prefab betondorpels & afdekkers | 6-3-2028 | 5d |
| 56 | Stucwerk- & sauswerk op metselwerk | 6-3-2028 | 10d |
| 57 | Hekwerken | 20-3-2028 | 5d |
| 58 | Zonwering | 20-3-2028 | 10d |
| 59 | Steigerwerk demonteren | 21-3-2028 | 15d |
| 60 | Invoeren nutsbedrijven | 11-4-2028 | 10d |
| 61 | Uitvlakken tuin | 21-4-2028 | 5d |
| 62 | **AFBOUW algemene ruimten** | **3-12-2027** | **120d** |
| 63 | Stalen trappen | 3-12-2027 | 10d |
| 64 | Metal-stud voorzetwanden | 6-3-2028 | 15d |
| 65 | Houten kozijnen | 6-3-2028 | 15d |
| 66 | Kalkzandsteen vellingblokken in kelder | 6-3-2028 | 10d |
| 67 | Leidingwerk vloeren, wanden en plafonds | 13-3-2028 | 15d |
| 68 | Dekvloer algemene ruimte | 20-3-2028 | 5d |
| 69 | Liftinstallatie | 27-3-2028 | 20d |
| 70 | Stucwerk algemene ruimten | 27-3-2028 | 15d |
| 71 | Aftimmerwerkzaamheden | 10-4-2028 | 15d |
| 72 | Binnendeuren incl. hang en sluitwerk | 3-5-2028 | 5d |
| 73 | Saus- & schilderwerk algemene ruimten | 10-5-2028 | 15d |
| 74 | Afmonteren en inregelen installaties | 16-5-2028 | 15d |
| 75 | Postkasten, videofoon, armaturen | 1-6-2028 | 5d |
| 76 | **AFBOUW woningen** | **6-3-2028** | **82d** |
| 77 | Houten voorzetwanden tegen BSB (CLT) | 6-3-2028 | 35d |
| 78 | Metal-stud voorzetwanden & binnenwanden | 13-3-2028 | 35d |
| 79 | Binnendeurkozijnen | 13-3-2028 | 35d |
| 80 | Leidingwerk vloeren, wanden & plafonds | 20-3-2028 | 35d |
| 81 | Verlaagde plafonds | 27-3-2028 | 35d |
| 82 | Dekvloeren | 3-4-2028 | 35d |
| 83 | Dekvloer natte ruimtes | 10-4-2028 | 35d |
| 84 | Binnenwanden afwerken | 10-4-2028 | 35d |
| 85 | Stukadoorswerk | 18-4-2028 | 35d |
| 86 | Wandtegelwerk | 18-4-2028 | 35d |
| 87 | Vloertegelwerk | 20-4-2028 | 35d |
| 88 | Aftimmerwerkzaamheden | 28-4-2028 | 35d |
| 89 | Afhangen binnendeuren en H&S | 28-4-2028 | 35d |
| 90 | Kitwerk | 5-5-2028 | 35d |
| 91 | Saus- & schilderwerk | 5-5-2028 | 35d |
| 92 | Afmonteren en inregelen installaties | 12-5-2028 | 35d |
| 93 | **Oplevering** | **3-7-2028** | **15d** |
| 94 | Voorpleveren | 3-7-2028 | 6d |
| 95 | Voorpleverpunten oplossen | 6-7-2028 | 6d |
| 96 | Schoonmaken | 6-7-2028 | 6d |
| 97 | Definitief opleveren algemene ruimten en woningen | 14-7-2028 | 6d |

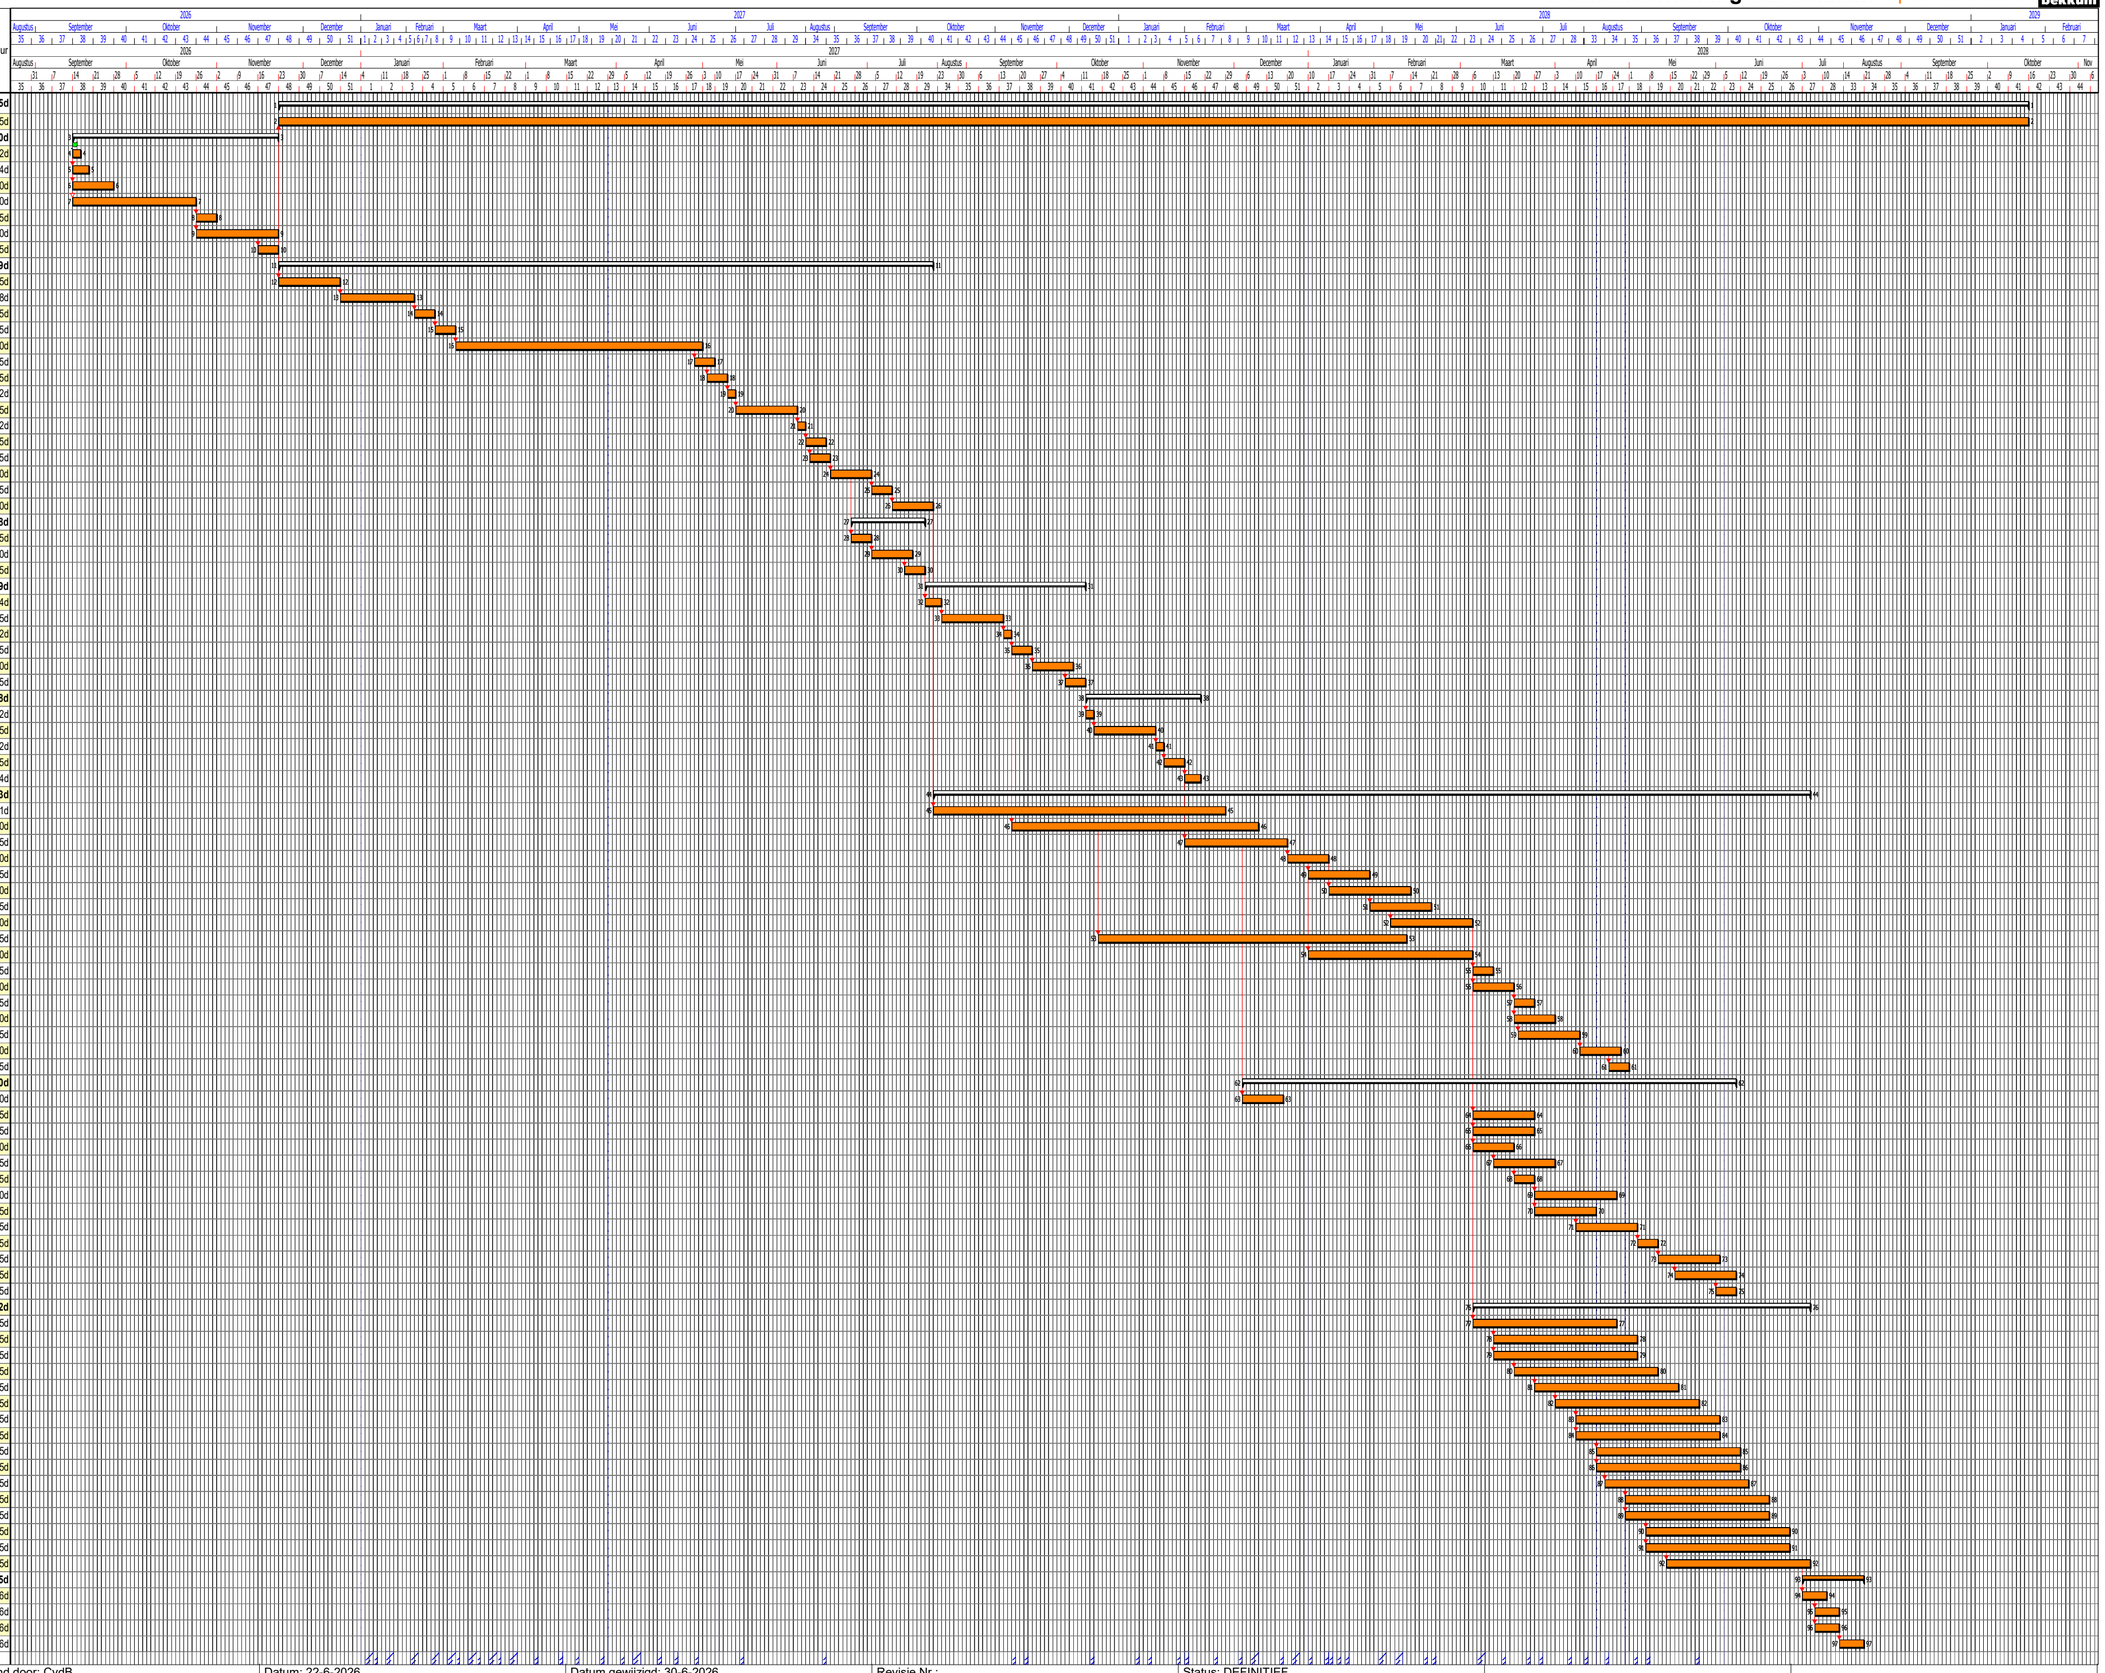


Werk Nr. 25006 | Getekend door: CvdB | Datum: 22-6-2026 | Datum gewijzigd: 30-6-2026 | Revisie Nr.: | Status: DEFINITIEF

*Planning gemaakt met PowerProject Teamplan*
